


# Baustellenticker

## Projekt Radwegsanierung K 22

Lage Tönisvorst (Biwak und Reckenhöfe)

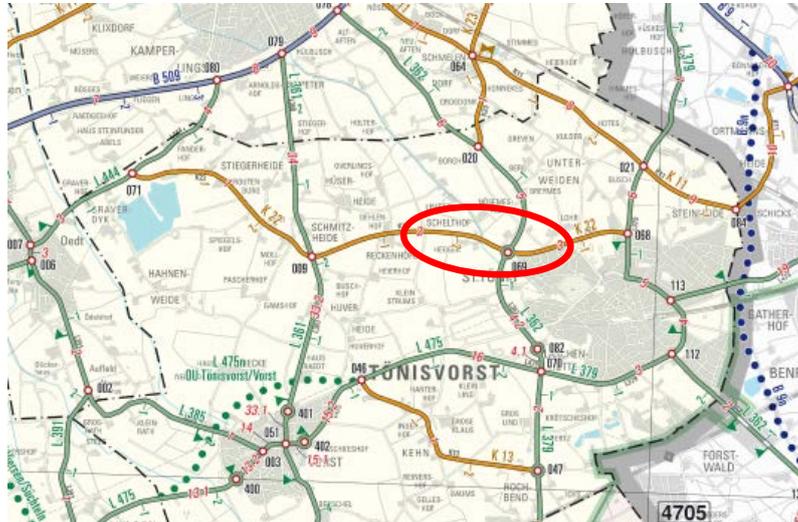

Projektleiter: Joachim Albers, 02162/39-1236  
[Joachim.albers@kreis-viersen.de](mailto:Joachim.albers@kreis-viersen.de)

Ausführende Firma: Fa. Willy Dohmen GmbH  
Hasenbuschstraße 46  
52531 Übach-Palenberg  
Telefon: 02451-98500  
Bauleiter: Herr Nießen

Baubeginn: 22.11.2023  
Fertigstellung: Frühjahr 2024

Aktuelles: Derzeit laufen die Arbeiten am Radweg K 22 in Tönisvorst.

Die Maßnahme umfasst Radwegbauarbeiten seitens des Kreises Viersen auf einer Gesamtlänge von rund 2.000 m zwischen Hüserheide und Unterschelthof (Reckenhöfe) sowie Schelthofer Straße bis Gelderner Straße.

Derzeit laufen die Arbeiten im Bauabschnitt 1 und im Bauabschnitt 2.1. Der Bauabschnitt 1 verläuft mit einer Länge von etwa 1.200 m von der Hüserheide/Huverheide bis ca. 150 m hinter Unterschelthof/Fliethbach. Dieser soll im Laufe der KW 13/2024 und somit noch vor dem Osterwochenende freigegeben werden. Da noch verschiedene Arbeiten durchzuführen sind, bleibt hier die Baustellenbeschilderung stehen.

Der Bauabschnitt 2.1 verläuft mit einer Länge von etwa 120 m von der Tankstelle Markant bis Schelthofer Straße. Dieser wird voraussichtlich in der KW 12/2024 freigegeben und die Einbahnstraßenregelung wird dann aufgehoben.

Dienstag, 19. März 2024

Voraussichtlich zum Dienstag, den 2. April erfolgt der Wechsel in die Bauabschnitte 2.2 und 3. Der Bauabschnitt 2.2 verläuft mit einer Länge von rund 360m zwischen der Schelthofer Straße bis Am Dängelshof. Der Bauabschnitt 3 liegt verläuft mit einer Länge von etwa 320 m zwischen Am Dängelshof und Gelderner Straße.

Für die beiden Bauabschnitte wird eine Einbahnstraße von der Schelthofer Straße (Richtung Osten frei) bis zur Einmündung Gelderner Straße eingerichtet. Die Ausfahrt von Am Dängelshof auf die K 22 ist nur in Richtung Osten möglich, die Einfahrt von der K 22 nur von Westen kommend.

Der Verkehr von Osten kommend wird wie im Bauabschnitt 2.1 ab der Gelderner Straße über die Gelderner Straße/Westring/Vorster Straße/Düsseldorfer Straße (L362) umgeleitet.

Die Radfahrer-/Fußgängerumleitung verläuft ab der Schelthofer Straße über die Heinrich.-Böll-Straße, über die Gerhart-Hauptmann-Straße zur Gelderner Straße und zurück zur K 22.

Die Arbeiten in den beiden Bauabschnitten werden in einer Bauzeit von insgesamt rund 8 Wochen durchgeführt. Witterungsbedingte Verzögerungen sind möglich.
